# 로켓랩(RKLB.US)

## 이번 연기가 마지막이길

2026년 10월 15일

| | | | |
|---|---|---|---|
| ✓ 투자판단 | ★★★★☆ | ✓ 목표주가 (LSEG, 컨센서스) | 104.94 달러 |
| ✓ 상승여력 | 76.5% | ✓ 현재주가 (10월 14일) | 59.2 달러 |


[글로벌 산업재]
이주은 연구위원
✉ junelee@shinhan.com


### 신한생각 연이은 발사 일정 연기는 투자심리 회복 지연

4번째 공식 발사 연기 발표. 빠른 반복 발사를 위한 신뢰도 확보는 필수적이나, 연이은 첫 발사 일정 연기와 구체적인 발사 목표 시점의 부재는 투자심리 회복을 지연시키는 요인. 3분기 실적에서 뉴트론 개발 진척과 상용화 로드맵을 구체화해 미래 성장에 대한 시장의 신뢰 회복 필요

### 24년에서 27년으로, 4번째 발사 연기

연초 뉴트론 1단 추진제 탱크 인증 실패 이후, 빠른 양산을 위해 수동 적층에서 자동 적층 방식(AFP)으로 제조 공정을 변경하고 설계를 개선해 발사체의 내구성을 강화. 이후 1단 전방 돔 제조 후 검사 과정에서 설계 변경 부위의 공극(Void) 발생 확인. 공극은 탱크의 강도와 내구성, 구조적 신뢰성을 저하시킬 수 있는 결함으로, 회사는 발생 원인 규명 후 제조 공정을 개선해 고품질의 탄소복합재 후방 돔 제작을 완료. 공정 개선 효과 확인한 뒤 뉴트론 전방 돔 제조를 재개

뉴트론 첫 발사까지는 새로운 전방 돔 제작 및 검사, 1단 조립, 수압·극저온 시험을 통한 기체 검증 등이 필요. 회사는 26년 연말까지 전방 돔 제작 및 검증을 진행하고 27년 1분기 중 1단 조립을 완료한 뒤 검증 테스트를 진행할 계획. 첫 발사는 27년으로 연기됐으며 목표 시점은 추후 공개 예정

### 뉴트론을 제외한 외형 성장 동력은 확보 중

8월 이후 미 우주군 위성 계약, 이리듐 인수 관련 절차 진전, 다수의 상업 발사 계약 등을 통해 중장기 성장 기반 확대. 다만, 중형 발사체 시장 내 경쟁 우위 확보와 서비스 시장 확장을 위해서는 뉴트론 상업화 필수


| 12월 결산 | 2024 | 2025 | 2026F | 2027F | 2028F |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 (백만달러) | 436 | 602 | 962 | 1,357 | 1,736 |
| 영업이익 (백만달러) | (190) | (235) | (177) | (38) | 153 |
| 영업이익률 (%) | (43.5) | (39.0) | (18.4) | (2.8) | 8.8 |
| EPS (달러) | (0.38) | (0.37) | (0.29) | (0.08) | 0.14 |
| PER (배) | - | - | - | - | 434.1 |
| ROE (%) | (40.6) | (18.8) | (7.2) | (0.7) | 4.6 |
| PBR (배) | 78.1 | 18.7 | 14.8 | 14.6 | 17.6 |
| EV/EBITDA (배) | - | - | - | 300.7 | 110.8 |

자료: LSEG, 신한투자증권

| | |
|---|---|
| S&P500 지수 (pt) | 7,718.9 |
| 시가총액 (십억달러) | 35.4 |
| 발행주식수 (백만주) | 543.6 |
| 유동주식비율 (%) | 99.2 |
| 52주 최고가 (달러) | 151.0 |
| 52주 최저가 (달러) | 37.6 |
| 주요주주 (%) | |
| VK Services, LLC | 5.8 |
| BlackRock Institutional Trust Company, | 4.9 |

| 수익률 (%) | 1M | 3M | 12M | YTD |
|---|---|---|---|---|
| 절대 | (5.4) | (24.9) | (13.0) | (15.2) |
| 상대 | (6.7) | (27.2) | (29.2) | (27.9) |

주가




* 공극(Void): 돔 구조물 내부에 생긴 빈 공간이나 기포 형태의 결함으로 복합재료를 여러 겹 쌓아 만든 구조물 안에 재료가 제대로 채워지지 않아 발생
* 돔(Dome): 엔진에 공급할 추진제(연료, 산화제) 저장 구조물

### 뉴트론 1단 제조 과정

| 과정 | 내용 |
|---|---|
| 1단 추진제 탱크 인증 실패 | 26년 1월 제3자가 수작업으로 제조한 추진제 탱크 인증 실패 |
| 제조법 변경 + 설계 변경 | 장기 양산공정으로 계획에 따라 AFP 자동적층방식으로 제조법 변경. Insert 제거, 1단 추진제 탱크의 전·후방 돔 일부 두께 증가(내구성 향상) |
| 전방 돔 내 공극(Void) 발견 | 강도(Strength), 내구성(durability), 신뢰성(reliability) 저하 |
| 원인 재현 및 제조 공정 개선 | 제조법 변경하면서 변경된 설계 부분에서 문제 발생. 기존 오토클래브 방식이 아닌 새로운 제조 공정 개발. 동일 문제 재현 성공, 공극 발생 방지를 위한 제조공정 완화 추가 |
| 후방 돔에서 개선 공정 검증 | 개선된 공정으로 실제 후방 돔 제조. 품질 확인을 통해 문제 해결로 판단 |
| 첫 발사 27년 연기 | 문제 조사 및 해결을 위한 시간 투입. 신규 전방 돔 제조와 검사 및 시험 필요 |

자료: 회사 자료, 신한투자증권

### 뉴트론 첫 발사를 위한 향후 단계

| 목표 시기 | 단계 | 과정 | 내용 |
|---|---|---|---|
| 26년 말 이전 | Step 1 | 새로운 전방 돔 제조 | AFP 장비를 사용하여 새로운 전방 돔 제작 진행 중 |
| | Step 2 | 경화 과정 + 시험 | 제작된 돔을 경화시킨 후 초음파 검사 등 여러 검사 방법을 통해 내부에 공극이나 다른 문제가 없는지 확인 |
| 27년 1분기 | Step 3 | 1단 완성 및 인증 | 포드 돔, 반구형 돔, 그리고 기타 구성품들을 조립하여 1단 로켓 전체 완성. 수압(Hydrostatic) 시험과 극저온(Cryo) 시험 차례로 수행 |

자료: 회사 자료, 신한투자증권

### 뉴트론 발사 일정 변경 내역

| 발표 시점 | 첫 발사 목표 | 변화 |
|---|---|---|
| 2021년 3월 1일 | 2024년 | 뉴트론 개발 최초 공개 당시 목표 |
| 2023년 8월 8일 | 2024년 | 2024년 발사 목표 재확인 |
| 2024년 2월 27일 | 2024년 말 | 2024년 연말까지 발사 가능 |
| 2024년 5월 6일 | 2025년 중반 | 첫 번째 공식 발사 연기. No earlier than mid-2025 |
| 2025년 2월 27일 | 2025년 하반기 | 2025년 하반기 발사 제시 |
| 2025년 11월 10일 | 2026년 | 두 번째 공식 발사 연기. 2026년 1분기 뉴트론 발사 패드 도착 |
| 2026년 2월 26일 | 2026년 4분기 | 세 번째 공식 발사 연기. 1단 추진제 탱크 파열로 4분기 발사 |
| 2026년 8월 12일 | 2026년 연말~27년 | 4분기 첫 발사에서 뉴트론 발사 패드 인도로 수정. 연내 발사 가능성은 존재 |
| 2026년 10월 14일 | 2027년 | 네 번째 공식 발사 연기. 27년 첫 발사 |

자료: 신한투자증권

- 첫 발사 후 개선과 수정을 진행하기 보다는 첫 비행부터 신속하고 반복 운용이 가능한 발사체 구축 목표

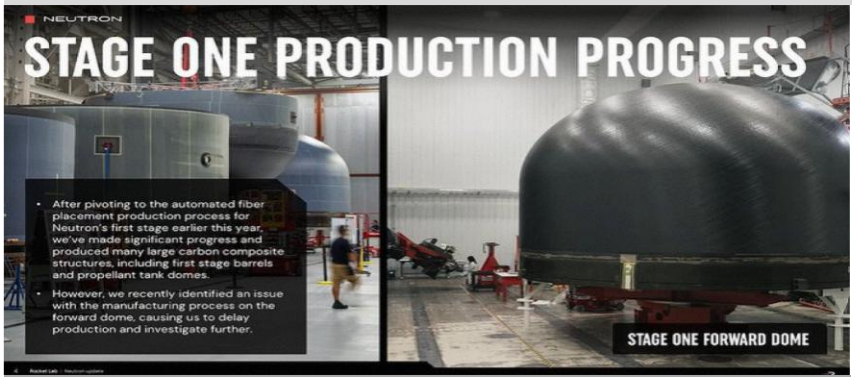
### 신뢰도 높은 발사체 구축을 위해 첫 발사 27년으로 연기




자료: 회사 자료, 신한투자증권

- 연초 1단 스테이지 인증 실패 이후, 생산 공정을 자동적층방식으로 전환

### 1단 스테이지 제조 방식 자동적층방식(AFP) 전환




자료: 회사 자료, 신한투자증권

- 탄소 복합재 부품은 금형에 적층된 후 경화 과정을 거침. 오토클레이브(가압 가열로) 진행 후 탄소 섬유층 사이 공극(void) 발견

### 1단 스테이지에서 공극(Void) 발견




자료: 회사 자료, 신한투자증권

- 개선된 제조 공정을 통해 공극 발생의 근본 원인 규명. 역대 최고 품질의 돔 제작 성공 후 새로운 돔 생산 재개

### 복합재 제조 공정 개선으로 문제 해결




자료: 회사 자료, 신한투자증권

- 26년 연내: AFP 장비로 신규 돔 제작 진행 중이며 제작된 돔은 경화 과정을 거친 후 검사를 통해 문제 여부 확인
- 27년 1분기: 1단 로켓 완성 후 수압&극저온 시험

### 27년 1분기까지 1단 조립 완료 목표



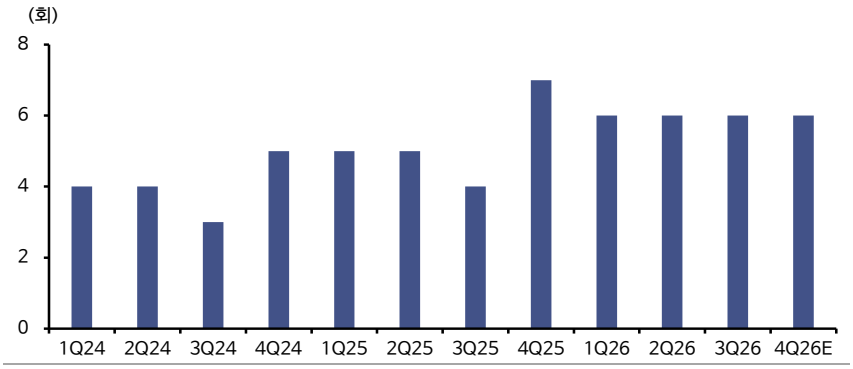

자료: 회사 자료, 신한투자증권

### 뉴트론의 신뢰성 확보를 통해 신규 기회 창출





자료: 회사 자료, 신한투자증권

### 로켓랩 26년 24회+ 발사 수행 전망





자료: 회사 자료, 신한투자증권

### 우주 기업 주가 추이




자료: LSEG, 신한투자증권

### 12개월 선행 PSR 밴드 챠트




자료: LSEG, 신한투자증권

## Compliance Notic

- 이 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다(작성자: 이주은).
- 본 자료는 과거의 자료를 기초로 한 투자참고 자료로서, 향후 주가 움직임은 과거의 패턴과 다를 수 있습니다.
- 자료 제공일 현재 당사는 상기 회사가 발행한 주식을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 자료 제공일 현재 당사는 지난 1년간 상기 회사의 최초 증권시장 상장시 대표 주관사로 참여한 적이 없습니다.
- 자료제공일 현재 조사분석 담당자는 상기회사가 발행한 주식 및 주식관련사채에 대하여 규정상 고지하여야 할 재산적 이해관계가 없으며, 추천의견을 제시함에 있어 어떠한 금전적 보상과도 연계되어 있지 않습니다.
- 당자료는 상기 회사 및 상기회사의 유가증권에 대한 조사분석담당자의 의견을 정확히 반영하고 있으나 이는 자료제공일 현재 시점에서의 의견 및 추정치로서 실적치와 오차가 발생할 수 있으며, 투자를 유도할 목적이 아니라 투자자의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 하고 있습니다. 따라서 종목의 선택이나 투자의 최종결정은 투자자 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.
- 본 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락없이 복사, 대여, 재배포될 수 없습니다.
